

議事（1）

富士見市における公共下水道整備 （社会資本総合整備計画）の事後評価について

令和2年度～令和6年度


みんな笑顔☆ふじみ
富士見市



1. 事後評価について

前回資料

交付金の活用にあたっては、効率的・効果的な事業の執行や透明性・客観性の確保、説明責任がより一層求められます。



事後評価の目的

- ① 事業の成果等を客観的に検証し、今後の方針を検討する
- ② 事業の成果を地域住民へ分かりやすく説明する

事後評価の時期

交付期間の終了時（終了後または最終年度中）に実施する


1. 事後評価について

前回資料

事後評価の内容

- ① 交付金を充てた要素事業の進捗状況
- ② 事業効果の発現状況
- ③ 評価指標（最終目標値）の達成状況
- ④ 今後の方針

事後評価の流れ

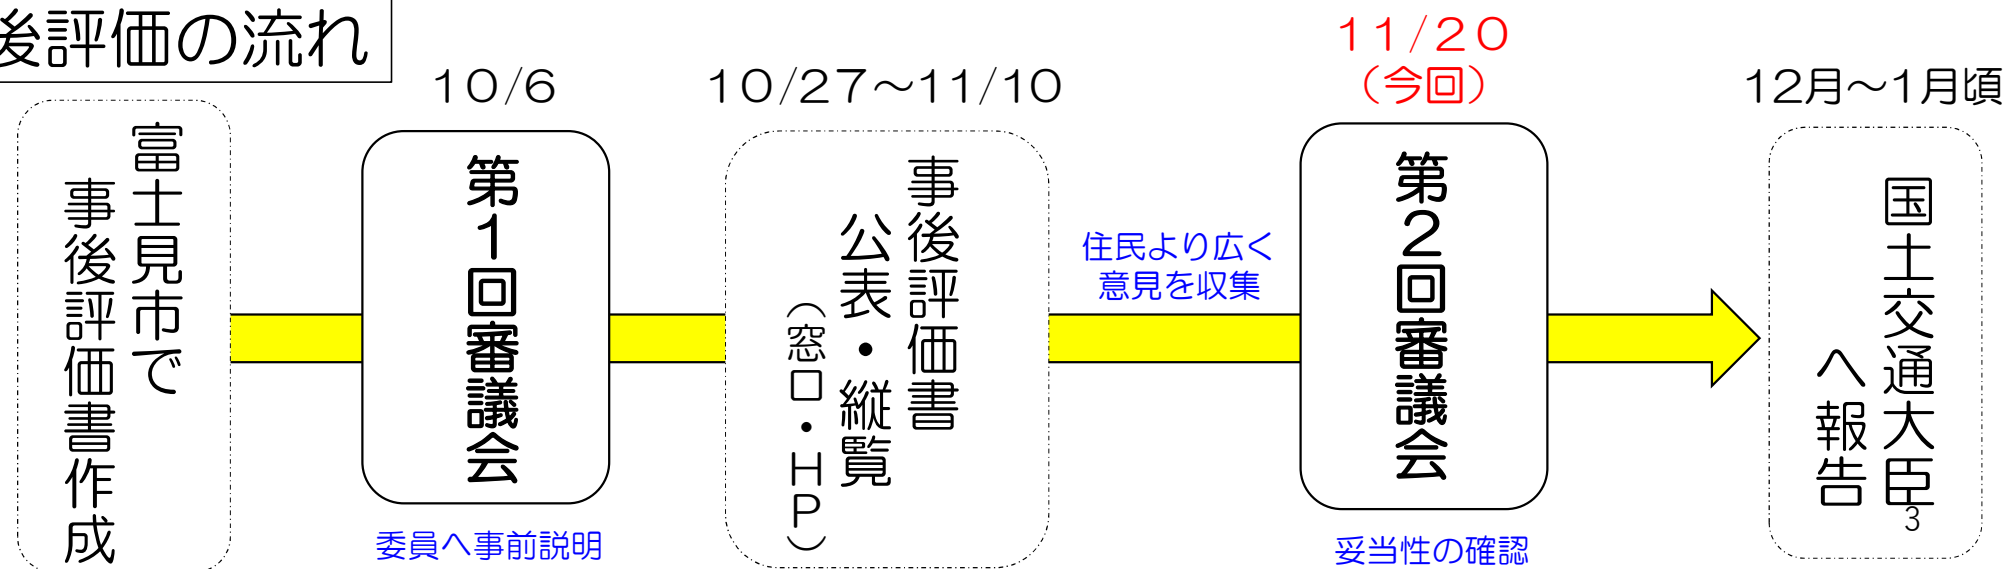

2. 事業の結果について

前回資料

事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期					事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬						
富士見市下水道事業審議会					公表の方法					富士見市ホームページ			黒字・・・計画 青字・・・市単独事業 赤字・・・実績			
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）
											R2	R3	R4	R5	R6	
A07-001	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠 (汚水)	新設	新河岸第14処理分区の污水管整備	管渠A=8.9ha 管渠A=5.4ha	富士見市						600 53 154
A07-002	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠 (汚水)	新設	新河岸第16処理分区の污水管整備	管渠A=10.0ha 管渠A=10.0ha	富士見市						600 45 192

新河岸第14処理分区の污水管整備

計画面積：8.9ヘクタール
実績面積：5.4ヘクタール

2. 事業の結果について

前回資料

事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期					事前説明：令和7年10月6日、評価：令和7年11月下旬						
富士見市下水道事業審議会					公表の方法					富士見市ホームページ						
										黒字・・・計画 青字・・・市単独事業 赤字・・・実績						
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業	地域	交付	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）
	種別	種別	対象								R2	R3	R4	R5	R6	
A07-001	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠 (汚水)	新設	新河岸第14処理分区の污水管整備	管渠A=8.9ha 管渠A=5.4ha	富士見市						600 53 154
A07-002	下水道	一般	富士見市	直接	富士見市	管渠 (汚水)	新設	新河岸第16処理分区の污水管整備	管渠A=10.0ha 管渠A=10.0ha	富士見市						600 45 192

新河岸第16処理分区の污水管整備

計画面積：10.0ヘクタール

実績面積：10.0ヘクタール

2. 事業の結果について

前回資料

社会資本総合整備計画 事後評価書（原案）					
計画の名称	安全・安心、快適な地域をつくる人のまち				
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）		富士見市		
計画の目標					
下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。					
計画の成果目標（定量的指標）					
①5か年における下水道（污水）整備達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。					
黒字・・・計画 赤字・・・実績					
定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値	中間目標値	最終目標値	
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）	
①5か年における下水道（污水）整備達成率 汚水整備済面積（0ha）／事業計画面積（18.9ha）		0% 0%	50% 73%	100% 81%	

黒字・・・計画
赤字・・・実績

新河岸第14処理分区の污水管整備
新河岸第16処理分区の污水管整備

計画面積：18.9ヘクタール
実績面積：15.4ヘクタール

整備達成率：81%

2. 事業の結果について


前回資料



2. 事業の結果について

前回資料

(参考図面) 社会資本総合整備計画

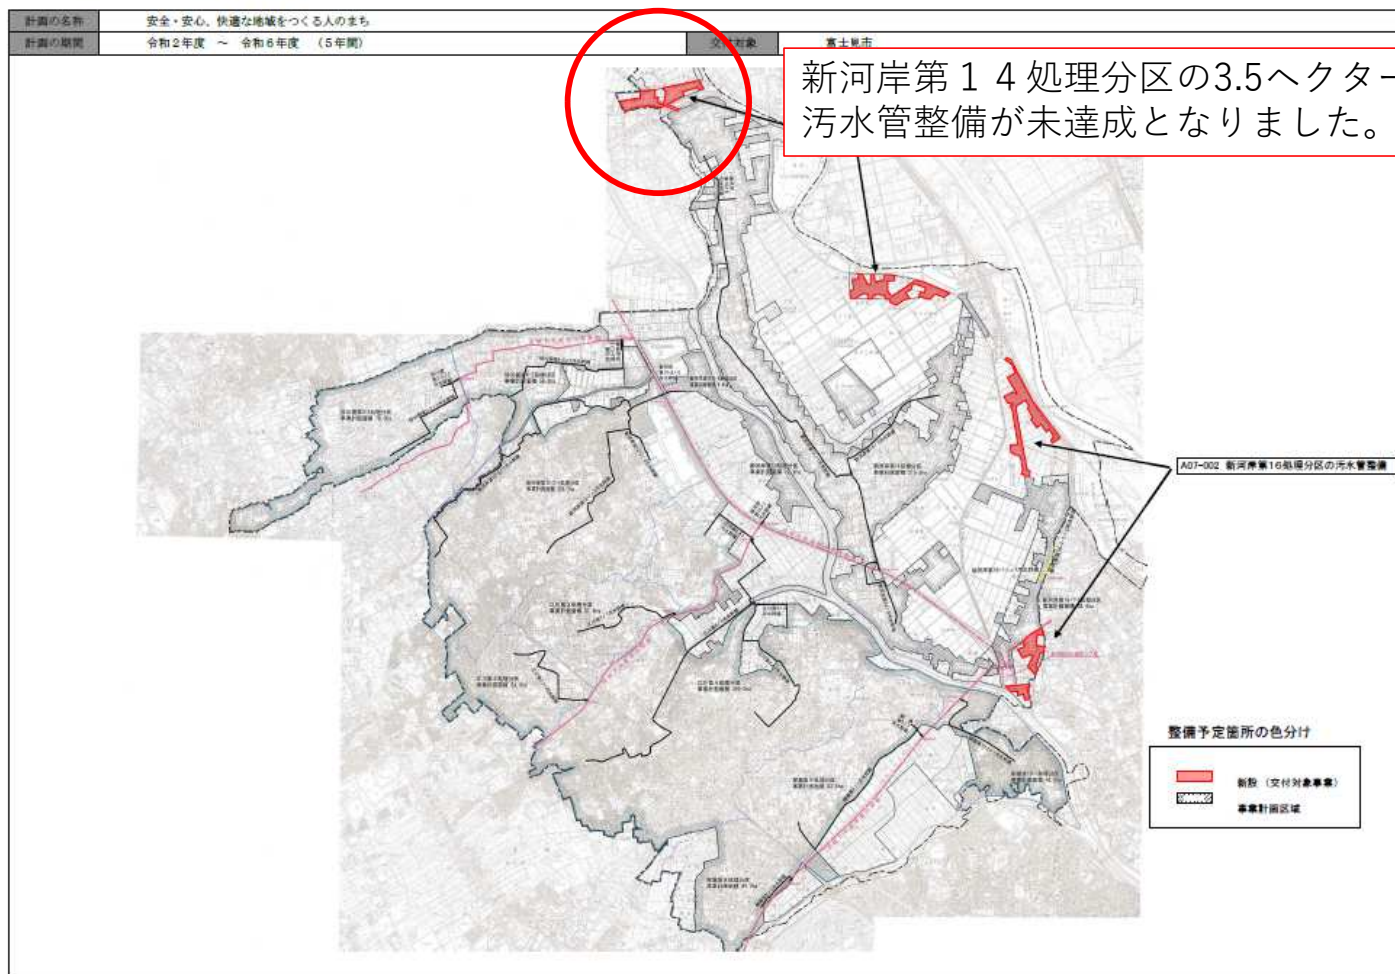


事後評価書の公表・縦覧結果について

追加資料①

事後評価書の公表・縦覧 ※ホームページ及び下水道課窓口

下水道課窓口公表状況



○縦覧・意見書の提出期間

10/27（月）～11/10（月）



富士見市ホームページ縦覧状況



縦 覧 者 : 無し

意見書の提出 : 無し

社会資本総合整備計画の事後評価に伴う追加資料
～国道254号和光富士見バイパス横断部 下水道管理設位置について～

追加資料②

